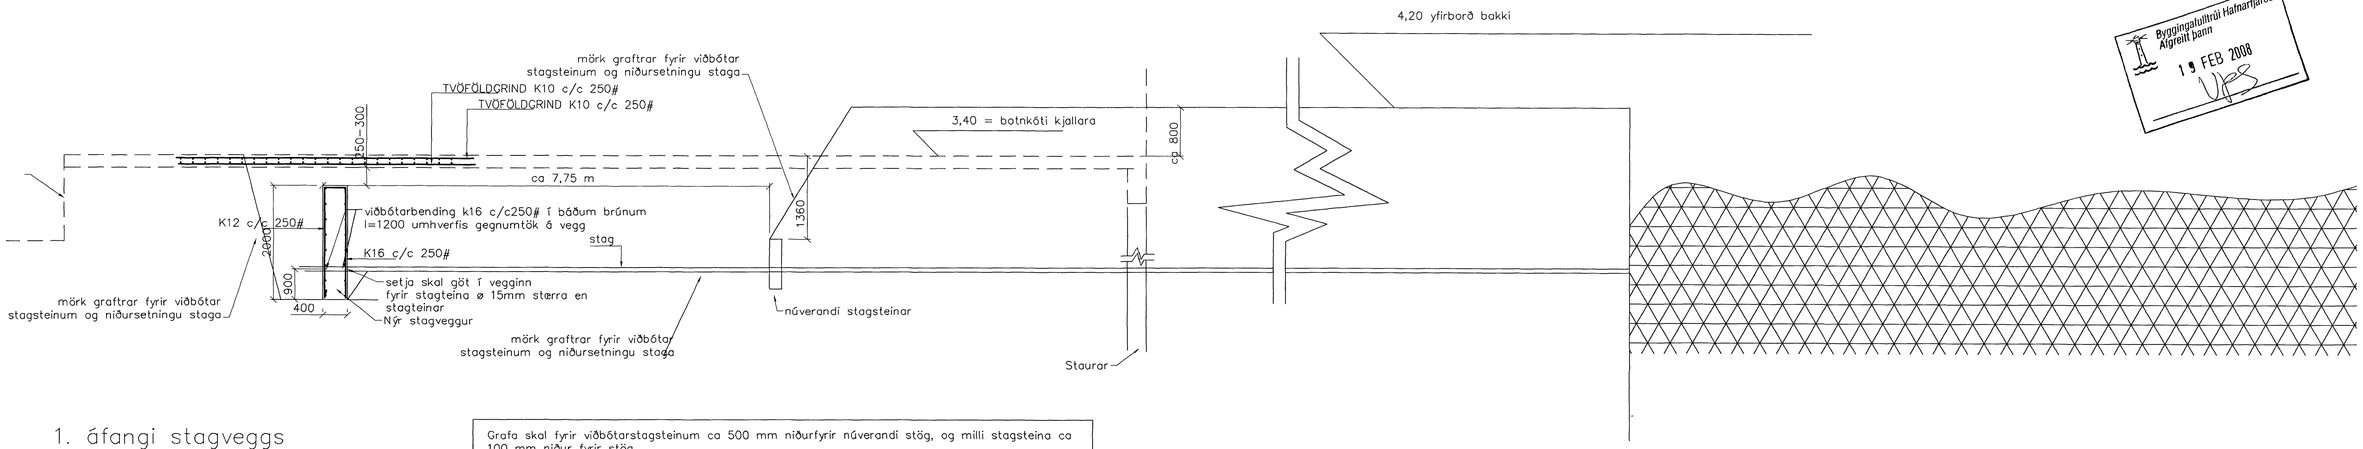

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
19 FEB 2008

1. áfangi stagveggs

Grafa skal fyrir viðbótarstagsteinum ca 500 mm niðurfyrir núverandi stög, og milli stagsteina ca 100 mm niður fyrir stög.
Steypa skal nýjan stagvegg
Koma fyrir nýjum stögum
Fylla milli stagveggja, í hæð ca 600 mm neðar en gólfkóti kjallara Fyllingin skal Þjappa
Herða stög og fylla bak við nýjan stagvegg.
Reka staura sem koma skulu milli stagveggja.
Grafa fyrir húsi framan við eldri stagsteina
Reka staura sem koma framan við eldri stagsteina
Hefja byggingu undirstaða og tilheyrandi húss

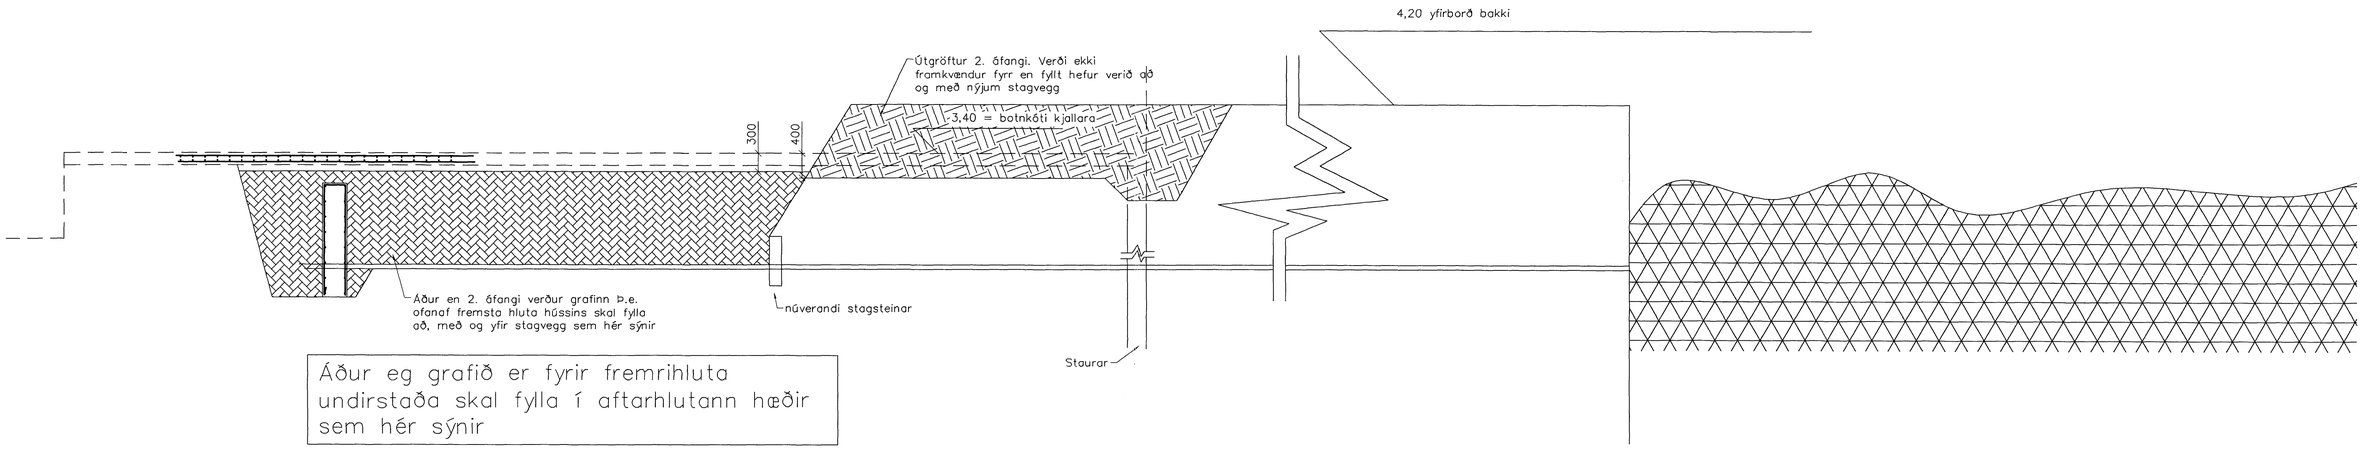

Áður eg grafið er fyrir fremrihluta undirstaða skal fylla í aftarhlutann hæðir sem hér sýnir

2. áfangi stagveggs

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

NORÐURBAKKI 5A–B–C
HAFNARFIRÐI

Graftrar og vinnuplan vegna viðbótar stagveggs

MKV. 1:50
DAGS. NÓV. 2006
VERK NR. 2608
TEIKN. NR. 1–03–STAGF.
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148–3009
TEIKNAÐ G.H.
YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknithjonusta@islandia.is
kt: 440693-2539
